


FIGUUR 2.8

RISICO-MATRIX

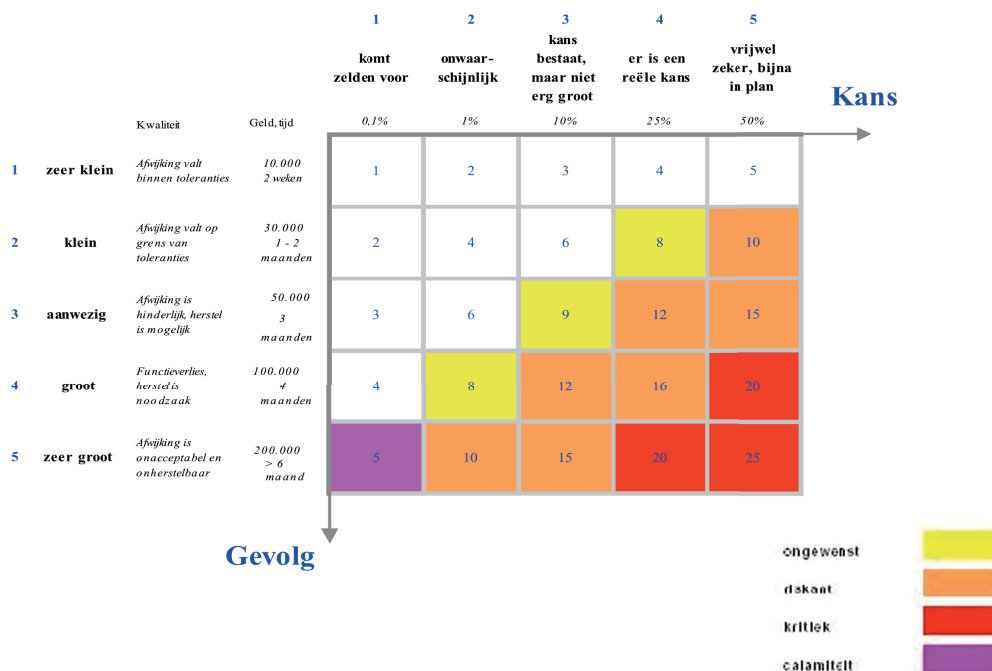

Vanuit de analyse worden beheersmaatregelen opgesteld. Deze worden afgestemd op de grootste risico's (ongewenst, riskant, kritiek, calamiteit). In die zin kan de risicoanalyse ook dienen als basis voor de aanbesteding, contractvorming, bouwfase alsmede de gebruikersfase.

RISICOMANAGEMENT MET HET RISICOFOMULIER

Uit de risicosessie volgt een risicofomulier als resultaat. In het formulier worden de risico's oorzaken en mogelijke gevolgen samengevat. Daarbij worden voor ieder risico de aspecten kans, tijd en geld vastgesteld. Waarmee de volgorde, van het belang van de risico's, kan worden aangegeven. Hiermee worden vervolgens de beheersaspecten of geld reserveringen vastgesteld. In de navolgende tabel staat een kort voorbeeld gegeven van het risicofomulier, als bijlage is een volledige ingevuld formulier opgenomen [voorbeeld project Dijkversterking Bergambacht-Schoonhoven door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard].

Risicofomulier (zie ingevuld voorbeeld in bijlage 2)									
Omschrijving	Oorzaak	Gevolg	kans	tijd	Geld	Totaal (kans x tijd)	Gevolg	Beheersmaatregel	Volgorde
omschrijving	toelichting	toelichting	1-5	1-5	1-5	n	□	toelichting	n.

De gevolgen kunnen worden opgedeeld in endogeen of exogeen (gevolgen binnen of buiten invloed van het project). Verder is een clustering te maken naar bijvoorbeeld: technisch; overlast en bereikbaarheid; communicatie; planning. Door het formulier periodiek bij te werken is een goed risicomangement mogelijk. Voor verschillende fase in het ontwerpproces kunnen voorkomende risico's en beheersmaatregelen worden afgestemd.
